




Kirche Spornitz, Sanierung Außenhaut und Dachtragwerk Turm Zwischenbericht

Stand 28.02.2020

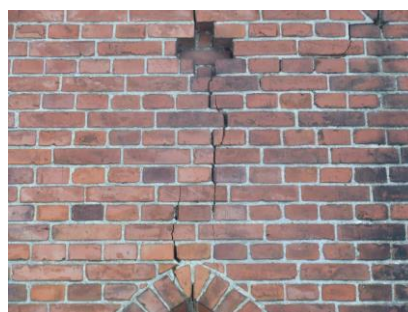

Sachbericht, Stand 28.02.2020

Die Leistungen der Hauptgewerke sind ausgeschrieben und vergeben.
Den Zuschlag haben erhalten:

Gerüstarbeiten	Carl Schütt Bautech GmbH, Lübz
Mauerarbeiten	WEKO Bau Parchim GmbH, Spornitz
Zimmerarbeiten	WEKO Bau Parchim GmbH, Spornitz
Klempnerarbeiten	Bedachung Güstrow GmbH, Güstrow

Am 08.01.2020 fand die Bauanlaufberatung statt und die Baustelle wurde eingerichtet. Am 22.01.2020 wurden zusammen mit dem Tragwerksplaner und dem Holzschutzsachverständigen die ersten Maßnahmen für die Zimmerarbeiten festgelegt.

Die Holzterapie wurde ertüchtigt und die Stufen abgedeckt. Die inneren Turmebenen wurden eingerüstet, die Maurer haben begonnen die Risse an den Innenseiten der vier Turmwände zu schließen. Die Arbeiten werden systematisch von unten nach oben ausgeführt. Stand Ende Februar sind die Risse im Mauerwerk bis zum Glockenstuhl saniert.

Durch die Zimmerleute wurden die gesamten Turmgeschosse von Bauschutt und Vogelkot befreit und die ersten Bohlenbeläge aufgenommen. Oberhalb der Eingangsebene wurde die Decke mit Dielen geschlossen.

Das Fassadengerüst auf der Außenseite des Turmes ist im Bereich des Turmmauerwerks gestellt, seit dem 19.02.2020 sind alle Gerüstlagen frei gegeben zur Bearbeitung.

Zur Festlegung des Fugenmörtels wurden erste Musterfugen angelegt.

Die Zimmerleute sanieren zur Zeit die ersten Deckenbalkenlagen.

Noch nicht ausgeschrieben sind die erforderlichen Arbeiten an den Zifferblättern sowie den Schall-Luken.



Am Ziffernblatt ist die Farbe abgeplatzt und die Vergoldung der Ziffern und Stundenstriche zeigt Fehlstellen



Riss im Sturzbereich ist mit Kalkmörtel geschlossen, es wurden auch Steine neu eingemauert



In den Deckenbalkenlagen wurde der Bauschutt entfernt um den Zustand der Hölzer beurteilen zu können
